Amis de Dreux Koudougou

Accès à l'eau

Renforcement du secteur de l'eau et de l'assainissement dans la commune de Koudougou 2014-2016

PHASE D'ÉTUDE

- Évaluation de l'enveloppe globale : 230 000 €, dont 200 000 € consacrés aux actions sur Koudougou
- Juillet 2013 : initiation du projet
- Impératifs à respecter dans la construction du projet
- Différentes versions :
  - . Construction d'un AEPS
  - . Construction de latrines individuelles
  - . Constructions de forages individuels
  - . Constructions de latrines publiques
- Mars 2014 : finalisation du projet

LE DOSSIER DÉFINITIF

- **3 volets du dossier définitif élaborés par nos soins à partir du dossier remis par le technicien eau de Koudougou**
- **Le projet comportait les travaux suivants à réaliser sur 3 ans :**
  - **Réhabilitation de 15 forages**
  - **Construction de 12 nouveaux forages**
  - **Construction de 12 blocs de latrines publiques**

LE DOSSIER DÉFINITIF

- **Les éléments financiers du projet :**

Coût global	**229 222 €**
▪ **Eau**	**158 723 €**
▪ **Assainissement**	**24 490 €**
▪ **Mesures sociales**	**12 594 €**
▪ **Complément**	**33 415 €**

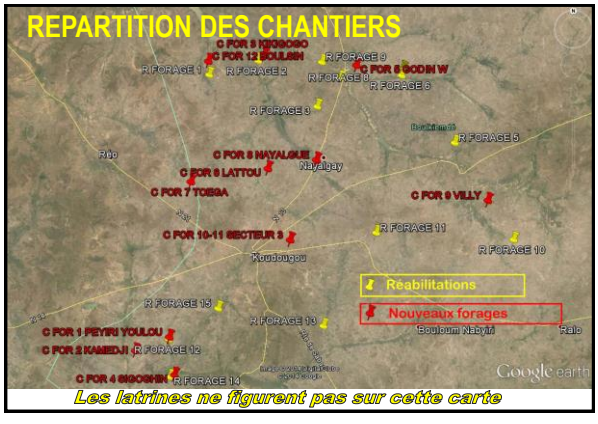

Les latrines ne figurent pas sur cette carte

Calendrier de validation des subventions

Avril 2014
- *Transmission du dossier de demande de subvention à l'Agence de l'Eau Seine Normandie*

Juin 2014
- *Réponse positive*
- *financement à hauteur de 70 %*
- *transmission d'une convention d'aide financière pour signature*

Répartition des financements

➢ *Agence de l'Eau Seine Normandie*	*70,0 %*	*160 455 €*
➢ *Agglo du pays de Dreux*	*13,0 %*	*29 799 €*
➢ *Ville de Dreux*	*8,5 %*	*19 484 €*
➢ *Association ADK*	*8,5 %*	*19 484 €*

Réalisations 2015

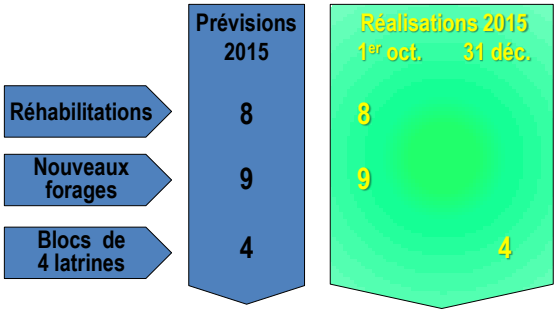

Réalisations 2016

	Prévisions 2016	Réalisations 2016 2 août	Réalisations 2016 31 déc.
Réhabilitations	7	4	3
Nouveaux forages	3	2	1
Blocs de 4 latrines	8	4	4

PRISE EN CHARGE DES TECHNCIENS ECHEANCIER

Année 2014 1 080 000			
Mars 2015 540 000	Juin 2015 540 000	Septembre 2015 540 000	Décembre 2015 540 000
Mars 2016 540 000	Juin 2016 540 000	Septembre 2016 540 000	Décembre 2016 540 000

Coût global du projet avant évaluation

- ***Budget initial*** ***229 143,70 €***
- *Réalisé début 2017 avant évaluation* *182 029,73 €*
- *Retenue de 10 % sur travaux* *17 929,49 €*
- ***Projection du TOTAL réalisé*** ***199 959,22 €***

Évaluation du projet

- **Novembre 2016 : recherche d'une société susceptible de réaliser l'évaluation du projet**
- **Après consultation de 4 sociétés, Bureau d'étude CORADE retenu pour un montant de 4 335 € TTC**
- **20 janvier 2017 : débit de l'étude d'évaluation**
- **Mars 2017 : réception du rapport définitif**

Conclusions du rapport d'évaluation

- ***Nombreuses malfaçons détectées*** *dans les superstructures d'une quinzaine de forages réhabilités ou nouveaux*
- ***Accompagnement du projet insuffisant dans la formation*** *:*
  - *des comités de gestion,*
  - *des associations des usagers de l'eau (AUE) et*
  - *des comités communaux de l'eau et de l'assainissement (CCEA)*
- ***Transmission du rapport à l'Agence de l'eau***
- ***Rencontre pour de déterminer les actions correctives à mettre en œuvre***

Actions correctives

ANOMALIES SUR LES SUPERSTRUCTURES

- ***Mois de mai 2017****, transmission à la mairie de Koudougou et au responsable de projet des anomalies signalées dans le rapport CORADE, en demandant que celles-ci soient corrigées le plus tôt possible*
- ***Fin septembre*** *: attente du rapport des corrections effectuées*

Actions correctives

MANQUE D'ACCOMPAGNEMENT

- ***formations complémentaires*** *pour les Comités de gestion, les AUE et les CCEA*
- *Société* ***CORADE*** *retenue pour sa connaissance parfaite du dossier*
- *Plan d'action défini pour un* ***coût global de 22 576,17 €***
- ***Formations de juillet à octobre***

Coût global du projet après corrections

Budget initial ……..	**229 143,70 €**
Réalisé début 2017 avant évaluation…...	182 029,73 €
Retenue de 10 % sur travaux ……..	17 929,49 €
Étude d'évaluation CORADE……	4 335,00 €
Actions de formations complémentaires...	22 576,17 €
Projection du TOTAL RÉALISÉ	**226 870,39 €**

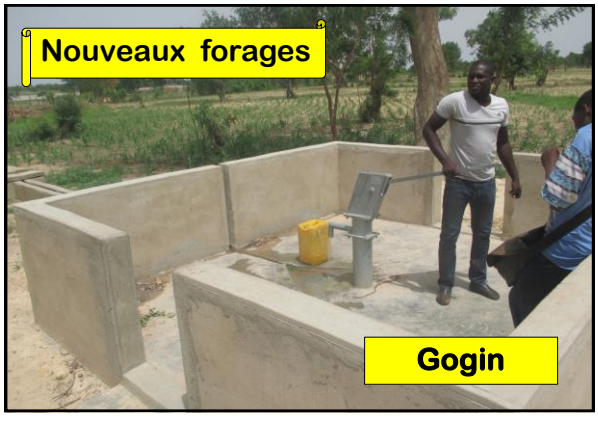
Nouveaux forages
Gogin

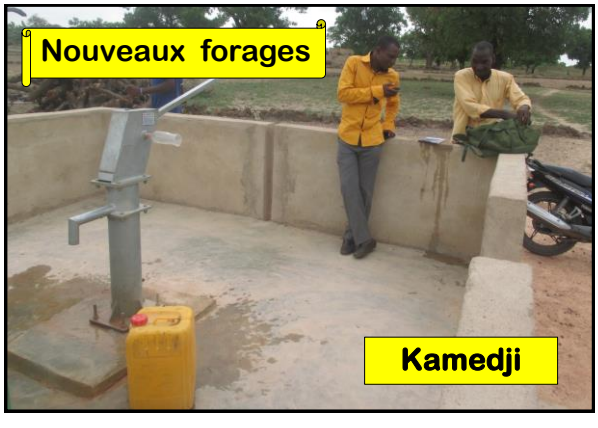
Nouveaux forages
Kamedji

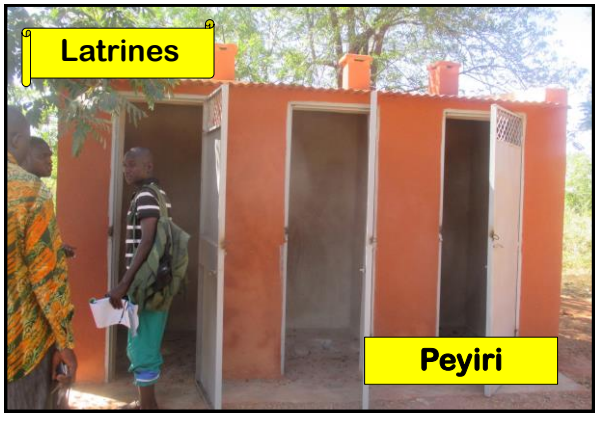
Latrines
Peyiri

Latrines
Tiogo Mossi

Latrines
Tiogo Mossi
